


ZMLUVNÝ HARMONOGRAM:
 Most nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava

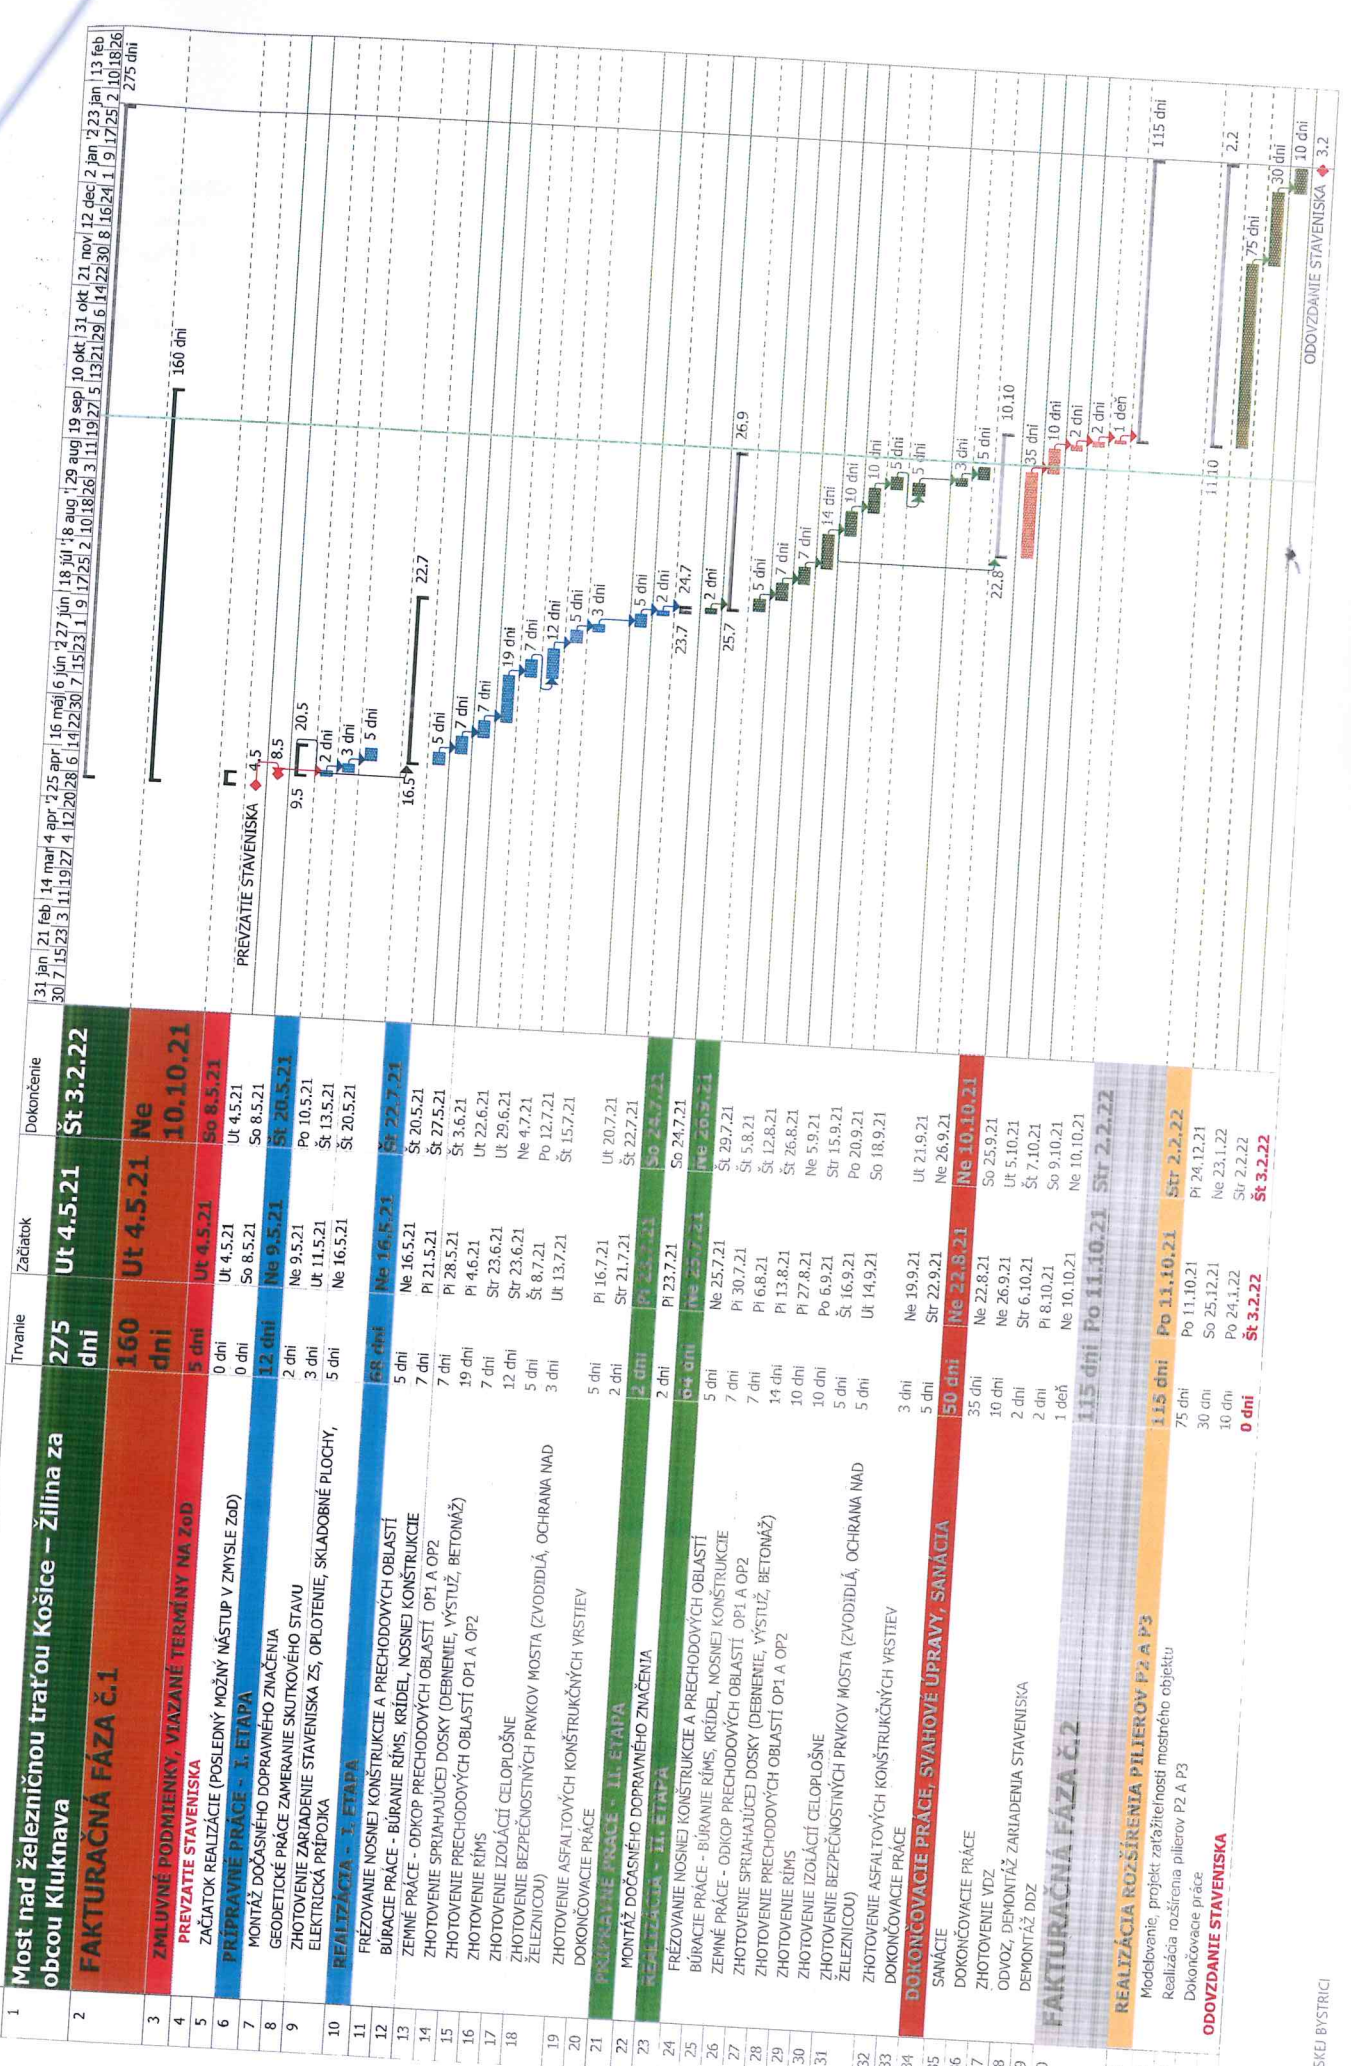

Identifikačný názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1 Most nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava	275 dní	Ut 4.5.21	Št 3.2.22
2 FAKTURAČNÁ FÁZA Č.1	160 dní	Ut 4.5.21	Ne 10.10.21
3 ZMLUVNÉ PODMIENKY, VIAZANÉ TERMÍNY NA ŽOD	5 dní	Ut 4.5.21	So 8.5.21
4 PREVZATIE STAVENISKA	0 dní	Ut 4.5.21	So 8.5.21
5 ZÁČIATOK REALIZÁCIE (POSLEDNÝ MOŽNÝ NÁSTUP V ZMYSLI ŽOD)	0 dní	So 8.5.21	So 8.5.21
6 PRÍPRAVNÉ PRÁCE - I. ETAPA	12 dní	Ne 9.5.21	Št 20.5.21
7 MONTÁŽ DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA	2 dni	Ne 9.5.21	Po 10.5.21
8 GEODETICKÉ PRÁCE ZAMERANIE SKUTOČNÉHO STAVU	3 dni	Ut 11.5.21	Št 13.5.21
9 ZHOTOVENIE ZARIADENIA STAVENISKA Z5; OPLIETENIE, SKLADOBNE PLOCHY, ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	5 dní	Ne 16.5.21	Št 20.5.21
10 REALIZÁCIA - I. ETAPA	68 dní	Ne 16.5.21	Št 22.7.21
11 FRÉZOVANIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE A PRECHODOVÝCH OBLASTÍ	5 dní	Ne 16.5.21	Št 20.5.21
12 BÚRACIE PRÁCE - BÚRANIE RÍMS, KRÍDEL, NOSNEJ KONŠTRUKCIE	7 dní	Pi 21.5.21	Št 27.5.21
13 ZEMNÉ PRÁCE - ODKOP PRECHODOVÝCH OBLASTÍ OP1 A OP2	7 dní	Pi 21.5.21	Št 27.5.21
14 ZHOTOVENIE SPRIAHAJÚCEJ OBLASTI OP1 A OP2	19 dní	Pi 4.6.21	Št 3.6.21
15 ZHOTOVENIE PRECHODOVÝCH OBLASTÍ OP1 A OP2 (DEBNENIE, VÝSTUŽ, BETONÁŽ)	7 dní	Pi 4.6.21	Ut 22.6.21
16 ZHOTOVENIE RÍMS	7 dní	So 23.6.21	Ut 22.6.21
17 ZHOTOVENIE ISOLÁCIÍ CELOPLOŠNE	12 dní	So 23.6.21	Ne 4.7.21
18 ZHOTOVENIE BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV MOSTA (ZVODIDILÁ, OCHRANA NAD ŽELEZNIČOU)	5 dní	Št 8.7.21	Ne 4.7.21
19 ZHOTOVENIE BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV MOSTA (ZVODIDILÁ, OCHRANA NAD ŽELEZNIČOU)	3 dni	Ut 13.7.21	Št 15.7.21
20 ZHOTOVENIE ASFALTOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH VRSTVIEI	5 dní	Pi 16.7.21	Ut 20.7.21
21 DOKONČOVACIE PRÁCE	2 dni	So 21.7.21	Št 22.7.21
22 MONTÁŽ DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA	2 dni	Pi 23.7.21	So 24.7.21
23 REALIZÁCIA - II. ETAPA	64 dní	Ne 25.7.21	Ne 20.8.21
24 FRÉZOVANIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE A PRECHODOVÝCH OBLASTÍ	5 dní	Ne 25.7.21	So 24.7.21
25 BÚRACIE PRÁCE - BÚRANIE RÍMS, KRÍDEL, NOSNEJ KONŠTRUKCIE	7 dní	Ne 25.7.21	So 24.7.21
26 ZEMNÉ PRÁCE - ODKOP PRECHODOVÝCH OBLASTÍ OP1 A OP2	7 dní	Pi 30.7.21	Št 5.8.21
27 ZHOTOVENIE SPRIAHAJÚCEJ OBLASTI OP1 A OP2	14 dní	Pi 30.7.21	Št 12.8.21
28 ZHOTOVENIE PRECHODOVÝCH OBLASTÍ OP1 A OP2 (DEBNENIE, VÝSTUŽ, BETONÁŽ)	10 dní	Pi 13.8.21	Št 26.8.21
29 ZHOTOVENIE RÍMS	10 dní	Pi 27.8.21	Ne 5.9.21
30 ZHOTOVENIE ISOLÁCIÍ CELOPLOŠNE	10 dní	Po 6.9.21	So 9.9.21
31 ZHOTOVENIE BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV MOSTA (ZVODIDILÁ, OCHRANA NAD ŽELEZNIČOU)	5 dní	Št 16.9.21	So 20.9.21
32 ZHOTOVENIE ASFALTOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH VRSTVIEI	5 dní	Ut 14.9.21	So 18.9.21
33 DOKONČOVACIE PRÁCE	3 dni	Ne 19.9.21	Ut 21.9.21
34 SAMÁCIE	5 dní	So 22.9.21	Ne 26.9.21
35 DOKONČOVACIE PRÁCE, SVAHOVÉ ÚPRAVY, SAMÁCIA	50 dní	Ne 22.8.21	Ne 10.10.21
36 DOKONČOVACIE PRÁCE	35 dní	Ne 22.8.21	So 25.9.21
37 ZHOTOVENIE VDZ	10 dní	Ne 25.9.21	So 25.9.21
38 ODVOZ, DEMONTÁŽ ZARIADENIA STAVENISKA	2 dni	So 25.9.21	So 25.9.21
39 DEMONTÁŽ DDZ	2 dni	So 25.9.21	So 25.9.21
40 FAKTURAČNÁ FÁZA Č.2	115 dní	Po 11.10.21	So 10.10.21
41 REALIZÁCIA ROZŠÍRENIA PILIEROV P2 A P3	115 dní	Po 11.10.21	So 2.2.22
42 Modifikovanie, projekt zatiaľčinnosti mostného objektu	75 dní	Po 11.10.21	Pi 24.12.21
43 Realizácia rozšírenia pilierov P2 A P3	30 dní	So 25.12.21	Ne 23.1.22
44 Dokončovacie práce	10 dní	Po 24.1.22	So 2.2.22
45 ODOVZDANIE STAVENISKA	0 dní	Št 3.2.22	Št 3.2.22
